UNIVERSIDAD VERACRUZANA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
10 JUL 2018
HORA: 14:43 FOLIO:

Acuse

Universidad Veracruzana
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

DGRF 585/07/2018
Xalapa, Equez., Ver. a 10 de julio de 2018

L.C. Ángel Zamael Benítez Peralta
Director General de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz
P r e s e n t e

Lomas del Estadio s/n
Edifico "A", 4to piso,
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Teléfono
01 (228) 8 42 17 20

Conmutador
8 42 17 00
8 42 27 00

Extensiones
11720, 11201, 11205

Fax
842 27 53

Correo electrónico
emurcia@uv.mx

En seguimiento a la información que se entrega trimestralmente a través del Portal Aplicativo del Sistema de Hacienda (PASH) y en atención al correo de fecha 31 de mayo de 2018, le informo que se llevó a cabo la captura del informe del segundo trimestre del ejercicio 2018 para los siguientes conceptos:

Concepto	Recurso Autorizado	Recurso Recibido	Recurso Ejercido	Año del Recurso	Folio Generado
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	40,089,928.00	40,089,928.00	1,013,817.77	2018	VER00180201135341
Subsidio Federal Ordinario (U006)	2,470,044,763.00	1,310,109,399.00	1,193,769,353.37		VER18180101073633
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) (S267)	50,329,668.00	50,329,668.00	46,855,510.85	2017	VER17170100835906
Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProExES) (U079)	1,178,081.00	1,178,081.00	1,171,280.62		VER17170300965871
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	25,626,949.00	10,660,744.24		VER17170300966204
Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES) (U080)	999,577.12	999,577.12	772,393.79		VER17170300965531
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	678,000.00	678,000.00	397,547.56		VER17170401045841
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	18,589,774.00	18,589,774.00	18,589,774.00	2016	VER16160300740473
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	412,000.00	259,583.07	2015	VER15150400611018

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
VERACRUZ
10 JUL. 2018
RECIBIDO
HORA: 13:14
EL SELLO SOLO AMPARA LA RECEPCIÓN

C.c.p. Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso, Secretario de Administración y Finanzas de la UV. Para conocimiento.
C.c.p. Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha, Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.
C.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernández, Directora de Presupuestos de la UV. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
DEPTO. DE ANALISIS PRESUPUESTAL
10 JUL 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
RECIBIDO
10 JUL. 2018
HORA 13:16

CAPTURA PORTAL APLICATIVO DEL SISTEMA DE HACIENDA (PASH) – SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

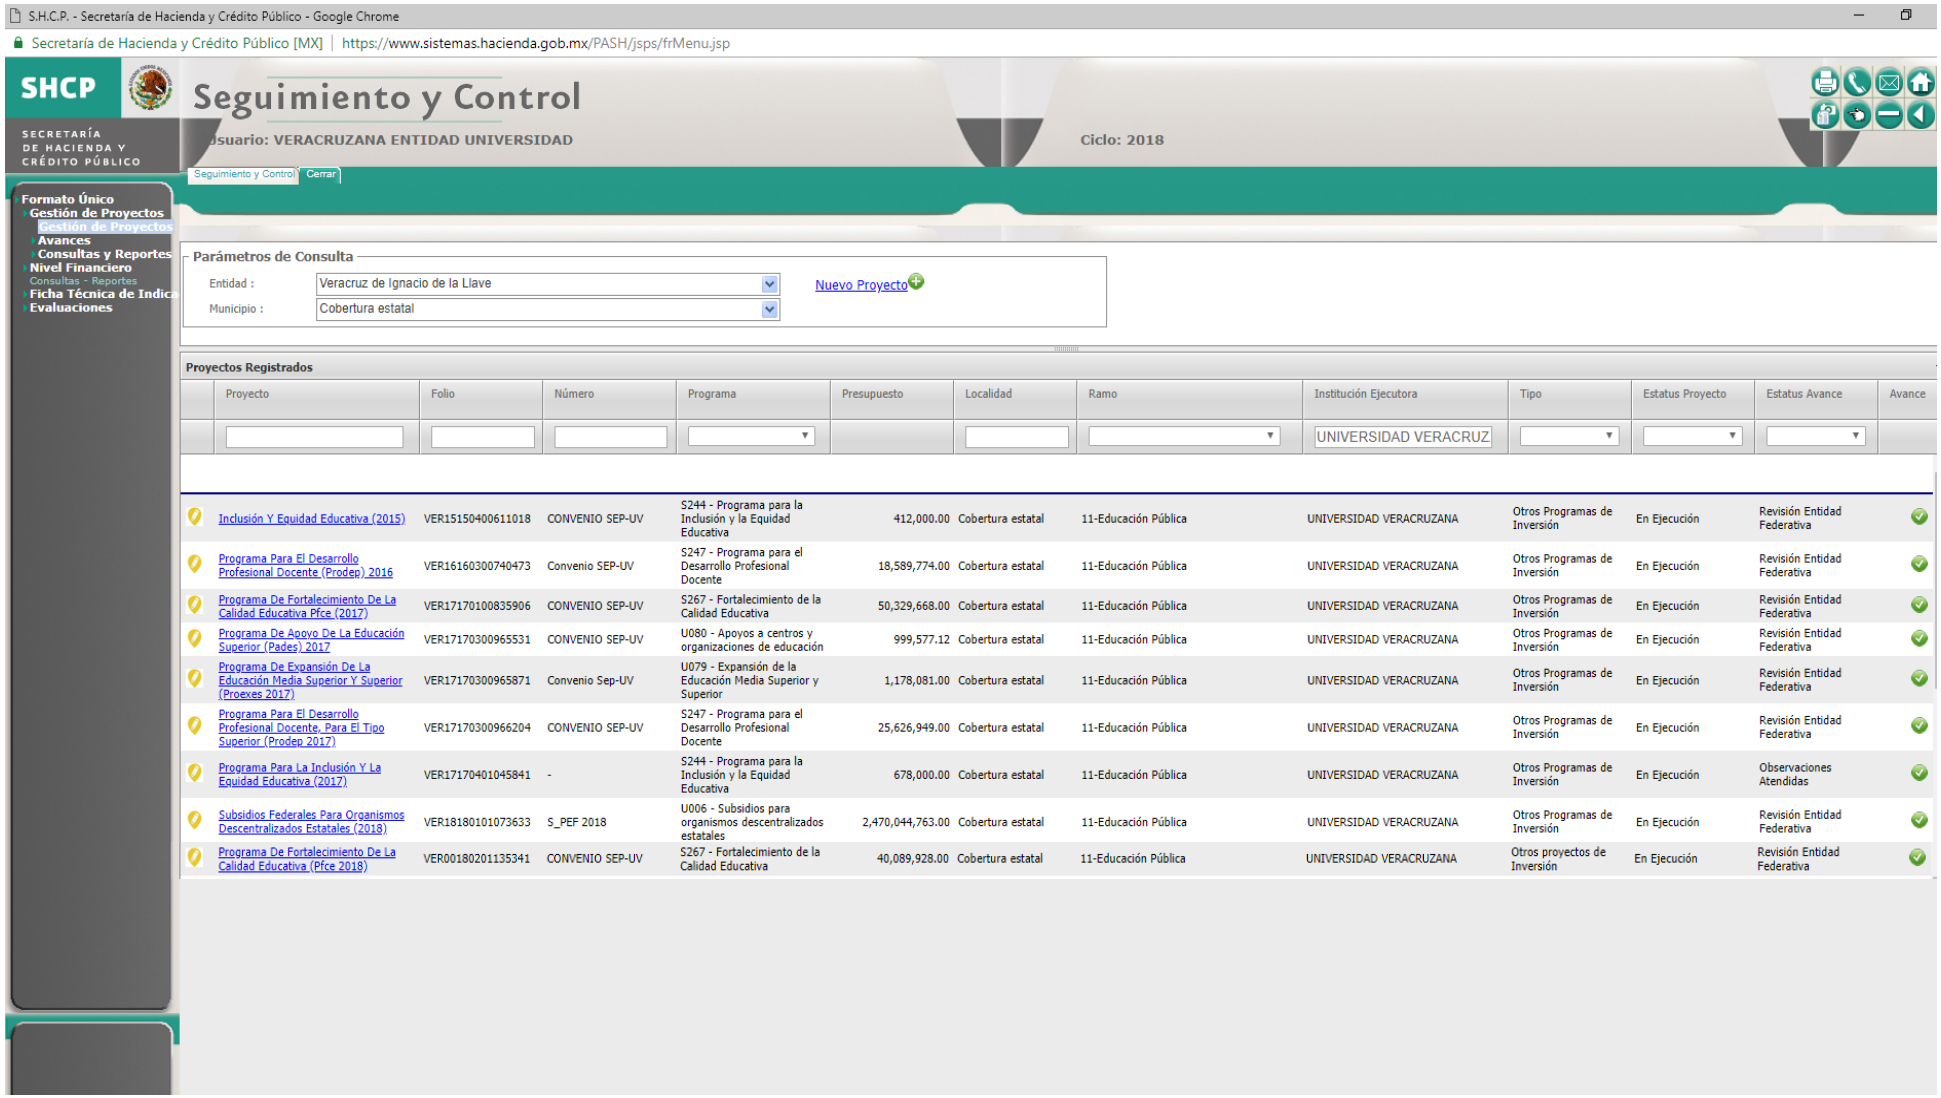

Universidad Veracruzana

Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos

1536

DGRF/544/07/2018
02 de julio de 2018

Mtra. Anabel Galván Sarabia
Directora General de Inversión Pública
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado
P r e s e n t e

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del segundo trimestre de 2018 con las cifras que capturamos en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

FAM 2010-2015		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
$187,568,508.00	$78,897,898.00	Existen 35 obras suspendidas; 21 en ejecución y 11 terminadas. De estos ejercicios la SEFIPLAN nos adeuda $107,940,749.00
FAM 2016		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
$21,261,081.00	$0.00	Las Obras se reportan suspendidas por la falta de radicación del recurso, por parte de la SEFIPLAN por $21,261,081.00
FAM 2018		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
$21,839,851.20	$0.0	Se encuentran 4 obras en ejecución
FAM 2018 Remanente		
Modificado-Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
$1,041,021.53	$0.00	Se encuentra 1 obra en ejecución

Universidad Veracruzana
Dirección General de Recursos Financieros
Dirección de Presupuestos

DGRF/544/07/2018
02 de julio de 2018

Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de $130,145,850.00 y se integran como sigue:

Edificio A de Rectoría 4to. Piso
Lomas del Estadio s/n, C.P. 91000
Col. Zona Universitaria
Xalapa de Enríquez
Veracruz, México

Teléfonos
(228) 842 17 23
(228) 842 17 00
Ext. 11720

Correo Electrónico
emurcia@uv.mx

FAM 2009	$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Evangelina Murcia Villagómez
Directora General de Recursos Financieros
Universidad Veracruzana

c.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazzarini. Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado. Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. José Ángel Mejía Martínez del Campo. Director de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.
c.c.p. Mtro. Salvador Tapia Spinoso. Secretario de Administración y Finanzas. Mismo fin.
c.c.p. Dr. Octavio A. Ochoa Contreras. Secretario de Desarrollo Institucional. Mismo fin.
c.c.p. Mtra. Emilia Patricia Rodiles Justo. Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento. Mismo fin.
c.c.p. C.P. Martha I. Lechuga Hernandez. Directora de Presupuestos. Mismo fin.
c.c.p. Archivo
ERI/cabm

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
ACAYUCAN																	
VER12130100009984	401C4100120015.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y CUBÍCULOS EN FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS EN ACAYUCAN, VER, REGIÓN COATZACOALCOS	ACAYUCAN	FAM 2012	561,962	561,962	561,962	561,962	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150200540318	401C4100150011.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 2A.ETAPA DE MÓDULO DE LAB., AULA ELECTRÓNICA Y CENTRO DE AUTOACCESO EN FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS, REGIÓN COATZACOALCOS	ACAYUCAN	FAM 2015	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,133,095	5,133,095		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.33	EN EJECUCIÓN
BOCA DEL RÍO																	
VER12130100010002	401C4100120005.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2012	740,326	740,326	740,326	740,326	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010007	401C4100120006.12	APORTACIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA HABILITAR SALA DE ESPERA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA REGIÓN VERACRUZ.	BOCA DEL RÍO	FAM 2012	66,198	66,198	66,198	66,198	0	0		1.00	1.00	PAGO	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300553069	401C4100130012.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE, REGIÓN VERACRUZ, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2013	232,000	232,000	232,000	232,000	231,988	231,988		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	99.99	TERMINADA
VER15150300553084	401C4100150019.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO,, AULA, CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBICULOS EN LA FAC. DE EDUC. FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2015	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,486,664	4,486,664		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	99.70	EN EJECUCIÓN
VER15150200540404	401C4100150020.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CLINICA DENTAL Y AULA EN LA FAC. DE ODONTOLOGÍA, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2015	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
COATZACOALCOS																	
VER12130100010018	401C4100120008.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2012	369,930	369,930	369,930	369,930	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010030	401C4100120013.12	APORTACIÓN PARA EL CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2012	62,313	62,313	62,313	62,313	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418915	401C4100140005.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2014	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	71.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300553098	401C4100140010.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	63.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553111	401C4100150005.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2015	763,539	763,539	763,539	763,539	674,598	674,598		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	88.35	EN EJECUCIÓN
VER00130400232337	401C4100130010.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2013	79,326	79,326	79,326	79,326	52,767	52,767		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	66.52	EN EJECUCIÓN
VER00130400232325	401C4100130005.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2013	1,294,376	1,294,376	1,294,376	1,294,376	1,157,286	1,157,286		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	89.41	EN EJECUCIÓN
CÓRDOBA																	
VER11130100009890	401C4100110012.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2011	20,597	20,597	20,597	20,597	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010045	401C4100120009.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2012	711,800	711,800	711,800	711,800	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00130400232416	401C4100130008.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2013	339,348	339,348	339,348	339,348	288,383	288,383		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	84.98	EN EJECUCIÓN
VER00130400232407	401C4100130003.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2013	1,565,486	1,565,486	1,565,486	1,565,486	743,170	743,170		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	47.47	EN EJECUCIÓN
VER14140400418971	401C4100140003.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2014	3,650,001	3,650,001	3,650,001	3,650,001	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	85.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418933	401C4100140008.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2014	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	88.00	0.00	SUSPENDIDA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
VER15150300553134	401C4100150003.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN CORDOBA	CÓRDOBA	FAM 2015	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,321,834	2,321,834		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	89.30	TERMINADA
IXTACZOQUITLÁN																	
VER00150300552093	401C4100150023.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 1)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2010	498,548	498,548	498,548	498,548	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552096	401C4100150024.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 2)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2011	223	223	223	223	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552099	401C4100150025.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 3)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2012	206,788	206,788	206,788	206,788	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300552101	401C4100150026.15	APORTACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA DEL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA (COMPL. DE REC. 4)	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2013	80,511	80,511	80,511	80,511	80,511	80,511		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER00140400419036	401C4100130018.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS CAMPUS IXTACZOQUITLÁN REGIÓN CÓRDOBA	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2013	9,601,636	9,601,636	9,601,636	9,601,636	9,500,700	9,500,700		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	98.95	EN EJECUCIÓN
VER15150200540366	401C4100150021.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ING. MECÁNICA ELÉCTRICA EN EL CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, REGIÓN CÓRDOBA	IXTACZOQUITLÁN	FAM 2015	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,993,208	9,993,208		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	99.93	TERMINADA
MINATITLÁN																	
VER00140200329711	401C4100130014.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 LAB DE ENTRENAMIENTO CLINICO EN LA UNIDAD DE COMPETENCIAS EN LA FAC DE MEDICINA REGIÓN COATZACOALCOS	MINATITLAN	FAM 2013	1,019,700	1,019,700	1,019,700	1,019,700	957,361	957,361		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	93.89	TERMINADA
VER00140200329720	401C4100130015.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAB CLINICO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA UNIDAD DEL PACIENTE Y CUBICULO EN LA FAC DE ENFERMERIA REGIÓN COATZACOALCOS	MINATITLAN	FAM 2013	348,462	348,462	348,462	348,462	348,462	348,462		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
ORIZABA																	
VER12130100010055	401C4100120012.12	APORTACIÓN PARA HABILITAR UN LABORATORIO DE CÓMPUTO EN ÁREA DE ARCHIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA REGIÓN CÓRDOBA	ORIZABA	FAM 2012	69,716	69,716	69,716	69,716	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
POZA RICA																	
VER12130100010077	401C4100120007.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2012	1,889,994	1,889,994	1,889,994	1,889,994	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00130400232474	401C4100130004.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2013	1,095,900	1,095,900	1,095,900	1,095,900	451,168	451,168		1.00	0.00	APORTACIÓN	70.00	41.17	EN EJECUCIÓN
VER00140200329731	401C4100130009.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2013	675,602	675,602	675,602	675,602	375,869	375,869		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	55.63	EN EJECUCIÓN
VER14140400418663	401C4100140004.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2014	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	61.00	0.00	SUSPENDIDA
VER00150300553168	401C4100140009.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2014	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	80.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553179	401C4100150004.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,673,411	1,673,411		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	88.07	EN EJECUCIÓN
VER15150300553189	401C4100150018.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE HIDRAULICA EN LA FAC. DE ING. CIVIL, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,059,952	2,059,952		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	82.40	EN EJECUCIÓN
VER15150200540429	401C4100150013.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA, CUBICULOS Y AREA ADMINISTRATIVA EN LA FAC. DE PEDAGOGÍA, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,049	1,199,049		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	99.92	TERMINADA
VER15150300553203	401C4100150014.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2015	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,469,614	4,469,614		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	89.39	EN EJECUCIÓN
VERACRUZ						0											
VER11130100009902	401C4100110011.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2011	239,769	239,769	239,769	239,769	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010090	401C4100120010.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2012	1,266,637	1,266,637	1,266,637	1,266,637	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
VER13130400232493	401C4100130002.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2013	2,081,051	2,081,051	2,081,051	2,081,051	1,271,015	1,271,015		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	61.08	EN EJECUCIÓN
VER13130400232499	401C4100130007.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2013	846,594	846,594	846,594	846,594	603,777	603,777		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	71.32	EN EJECUCIÓN
VER14140400418781	401C4100140002.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	6,143,614	6,143,614	6,143,614	6,143,614	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	74.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418805	401C4100140007.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2014	3,455,781	3,455,781	3,455,781	3,455,781	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	85.00	0.00	SUSPENDIDA
VER15150300553211	401C4100150002.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2015	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,170,951	4,170,951		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	92.69	EN EJECUCIÓN
XALAPA																	
VER10130100009852	401C4100100009.10	APORTACIÓN PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CONCIERTOS(ESTRUCTURA DE ACERO,ALBAÑILERÍA,INSTALACIONES,AIRE ACONDICIONADO,PLATAFORMA LEVADIZA)	XALAPA	FAM 2010	6,089,976	6,089,976	6,089,976	6,089,976	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER10130100009873	401C4100100005.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCION 2A ETAPA FACULTAD DE MATEMATICAS Y FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2010	2,406,276	2,406,276	2,406,276	2,406,276	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009928	401C4100110013.11	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	315,838	315,838	315,838	315,838	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009966	401C4100110008.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA PAR TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES, REGIÓN XALAPA, INC. PROYECTO	XALAPA	FAM 2011	408,000	408,000	408,000	408,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009960	401C4100110002.11	APORTACIÓN PARA LA 3A ETAPA CONSTRUCCIÓN DE LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2011	18,097,171	18,097,171	18,097,171	18,097,171	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	45.00	0.00	SUSPENDIDA
VER11130100009913	401C4100110001.11	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA DE LA FACULTAD DE PEDAGOGIA, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN Y SEA REGION XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	XALAPA	FAM 2011	1,976,170	1,976,170	1,976,170	1,976,170	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12140200329738	401C4100120014.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2012	175,161	175,161	175,161	175,161	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12130100010113	401C4100120011.12	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2012	6,079,083	6,079,083	6,079,083	6,079,083	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	0.00	SUSPENDIDA
VER12140400418010	401C4100120001.12	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIF. PARA POSGRADO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS E INV. EN EL CONOC. Y APRENDIZAJE HUMANO CEICAH, REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2012	11,802,596	11,802,596	11,802,596	11,802,596	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	95.00	0.00	SUSPENDIDA
VER13140100295740	401C4100130013.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGICA 2DA. ETAPA EN FAC DE ODONTOLOGÍA REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,013,325	1,013,325	1,013,325	1,013,325	1,013,158	1,013,158		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	99.98	TERMINADA
VER13130400232555	401C4100130001.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	7,073,906	7,073,906	7,073,906	7,073,906	5,931,852	5,931,852		1.00	0.00	APORTACIÓN	86.00	83.86	EN EJECUCIÓN
VER13140200329748	401C4100130011.13	APORTACIÓN PARA LA 2A ETAPA (biblioteca)DEL EDIF. DEL INST. INV. BIOTECNOLOGIA APLICADA INBIOTECA REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2013	702,829	702,829	702,829	702,829	702,829	702,829		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
VER13140200329756	401C4100130016.13	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA TEATRO Y DANZA EN LA UNIDAD DE ARTES REGION XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS 2)	XALAPA	FAM 2013	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,090,549	1,090,549		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	72.70	EN EJECUCIÓN
VER13130400232583	401C4100130006.13	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2013	1,172,020	1,172,020	1,172,020	1,172,020	649,727	649,727		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	55.44	TERMINADA
VER00150300553232	401C4100140011.14	APORTACIÓN PARA 3A. ETAPA (CUBICULOS) DEL EDIF. DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA APLIACADA INBIOTECA, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	70.00	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418043	401C4100140001.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN YADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,107,192	1,107,192		1.00	0.00	APORTACIÓN	50.00	11.07	SUSPENDIDA
VER14140400418501	401C4100140019.14	APORTACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPL. DEL HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LA UV REGION XALAPA	XALAPA	FAM 2014	6,573,999	6,573,999	6,573,999	6,573,999	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.0	0.00	SUSPENDIDA
VER14140400418086	401C4100140006.14	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2014	5,354,430	5,354,430	5,354,430	5,354,430	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	69.00	0.00	SUSPENDIDA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2010-2015

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
VER15150300553245	401C4100150016.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CEREBRALES (CICE), REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,496,119	3,496,119		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	99.89	TERMINADA
VER15150300553252	401C4100150012.15	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE GENÓMICA Y FISIOLOGÍA EN LA FAC. DE NUTRICIÓN, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
VER00150400594585	401C4100150001.15	APORTACIÓN PARA EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2015	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,411,639	8,411,639		1.00	0.00	APORTACIÓN	100.00	98.96	EN EJECUCIÓN
TOTAL					187,568,508	187,568,508	187,568,508	187,568,508	78,897,898	78,897,898							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2016

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
													PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
XALAPA																		
00160200665828	401C4100160001.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016		8,500,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
00160200665831	401C4100160006.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	4,500,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665840	401C4100160012.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE AUDITORÍAS Y TUTORÍAS EN LA UNIDAD CENTRAL, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	655,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665848	401C4100160016.16	CONCLUSIÓN DE EDIFICIO PARA LA FAC. DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA, REGIÓN XALAPA	XALAPA	FAM 2016	8,000,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
VERACRUZ																		
00160200665853	401C4100160002.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016		3,700,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
00160200665858	401C4100160007.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016	1,080,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665861	401C4100160015.16	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE GRANDES ESPECIES EN LA POSTA ZOOTÉNICA TORREÓN DEL MOLINO, REGIÓN VERACRUZ	VERACRUZ	FAM 2016	5,700,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
CÓRDOBA																		
00160200665866	401C4100160003.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016	3,400,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665872	401C4100160008.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016	2,820,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665876	401C4100160017.16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO Y CUBÍCULOS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN CÓRDOBA	CÓRDOBA	FAM 2016		1,031,955	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
POZA RICA																		
00160200665884	401C4100160004.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016		1,900,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
00160200665891	401C4100160009.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016	1,100,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665895	401C4100160013.16	CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA DE MÓDULO DE AULAS EN LA FAC. DE ARQUITECTURA, REGIÓN POZA RICA	POZA RICA DE HIDALGO	FAM 2016	5,000,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
COATZACOALCOS																		
00160200665899	401C4100160005.16	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO, REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2016	1,900,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
00160200665902	401C4100160010.16	PROGRAMA ANUAL DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS REGIÓN COATZACOALCOS	COATZACOALCOS	FAM 2016	1,100,000		0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	CANCELADO
BOCA DEL RÍO																		
00160200665905	401C4100160011.16	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIGITAL EN LA FAC. DE CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, REGIÓN VERACRUZ	BOCA DEL RÍO	FAM 2016		2,200,000	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
MINATITLÁN																		
00160200665917	401C4100160014.16	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA MATERIAS SELECTIVAS EN LA UNIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN	MINATITLÁN	FAM 2016	370,874	3,929,126	0	0	0	0	0		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.0	0.0	SUSPENDIDA
		TOTAL			35,625,874	21,261,081												

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
BOCA DEL RÍO																	
00180201132776	01922018600001	Aportación para la conclusión de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2018	3,700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
XALAPA																	
00180201132780	01922018600002	Aportación para la rehabilitación Integral Centro Cultural "Casa del Lago UV" 1a. Etapa, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018	4,666,666.67	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
COBERTURA ESTATAL																	
00180201132787	01922018600003	Aportación para el Programa Anual de Mantenimiento Institucional	Varias	FAM 2018	11,473,184.53	2,359,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
XALAPA																	
00180201132793	01922018600004	Aportación para la construcción de cisternas para almacenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento en la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa	Xalapa	FAM 2018	2,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		TOTAL			21,839,851.20	5,459,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORMATO ÚNICO DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2018 REMANENTES

PERIODO DEL 01/01/18 AL 30/06/18

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
IXTACZOQUITLÁN																	
00180201081083	01922018600006	Aportación para la conectividad de voz y datos para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba	Ixtaczoquitlán	FAM 2018 REMANENTE	1,041,021.53	260,255.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		TOTAL			1,041,021.53	260,255.38	0.00	0.00	0.00	0.00							

M. Arq. Emilia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtro. Salvador F. Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

INVERSIÓN PÚBLICA 2018
Registro Analítico de Avances Físicos y Financieros para el Formato Único de Hacienda
(pesos)

PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

UNIDAD PRESUPUESTAL / DESCRIPCION	LOCALIDAD	FONDO	FECHAS INIC.	FECHAS TERM.	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES PROGRAMADA ANUAL	METAS TOTALES ACUMULADA AL TRIM.	U. DE MEDIDA	AVANCE FISICO ACUM %	AVANCE FINAN. ACUM. %
UNIVERSIDAD VERACRUZANA																	
VARIOS																	
018220186000001 APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2018) PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIAS	FAM 2018	01/05/2018	31/12/2018	21,839,851.20	21,839,851.20	21,839,851.20	21,839,851.20	5,459,962.80	5,459,962.80	5,459,962.80		1.00	0.00	APORTACION	0.0	25.0
018220186000006 APORTACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) REMANENTE 2018 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	VARIAS	FAM REMANENTE 2018	01/05/2018	31/12/2018	21,839,851.20 1,041,021.53	21,839,851.20 1,041,021.53	21,839,851.20 1,041,021.53	21,839,851.20 1,041,021.53	5,459,962.80 260,255.38	5,459,962.80 260,255.38	5,459,962.80 260,255.38		1.00	0.00	APORTACION	0.0	25.0
					1,041,021.53	1,041,021.53	1,041,021.53	1,041,021.53	260,255.38	260,255.38	260,255.38						
		TOTAL UNIDAD PRESUPUESTAL:			**22,880,872.73**	**22,880,872.73**	**22,880,872.73**	**22,880,872.73**	**5,720,218.18**	**5,720,218.18**	**5,720,218.18**						
